


「令和2年7月豪雨」に係る応急仮設住宅団地（建設着手済み分）位置図（12月9日現在）

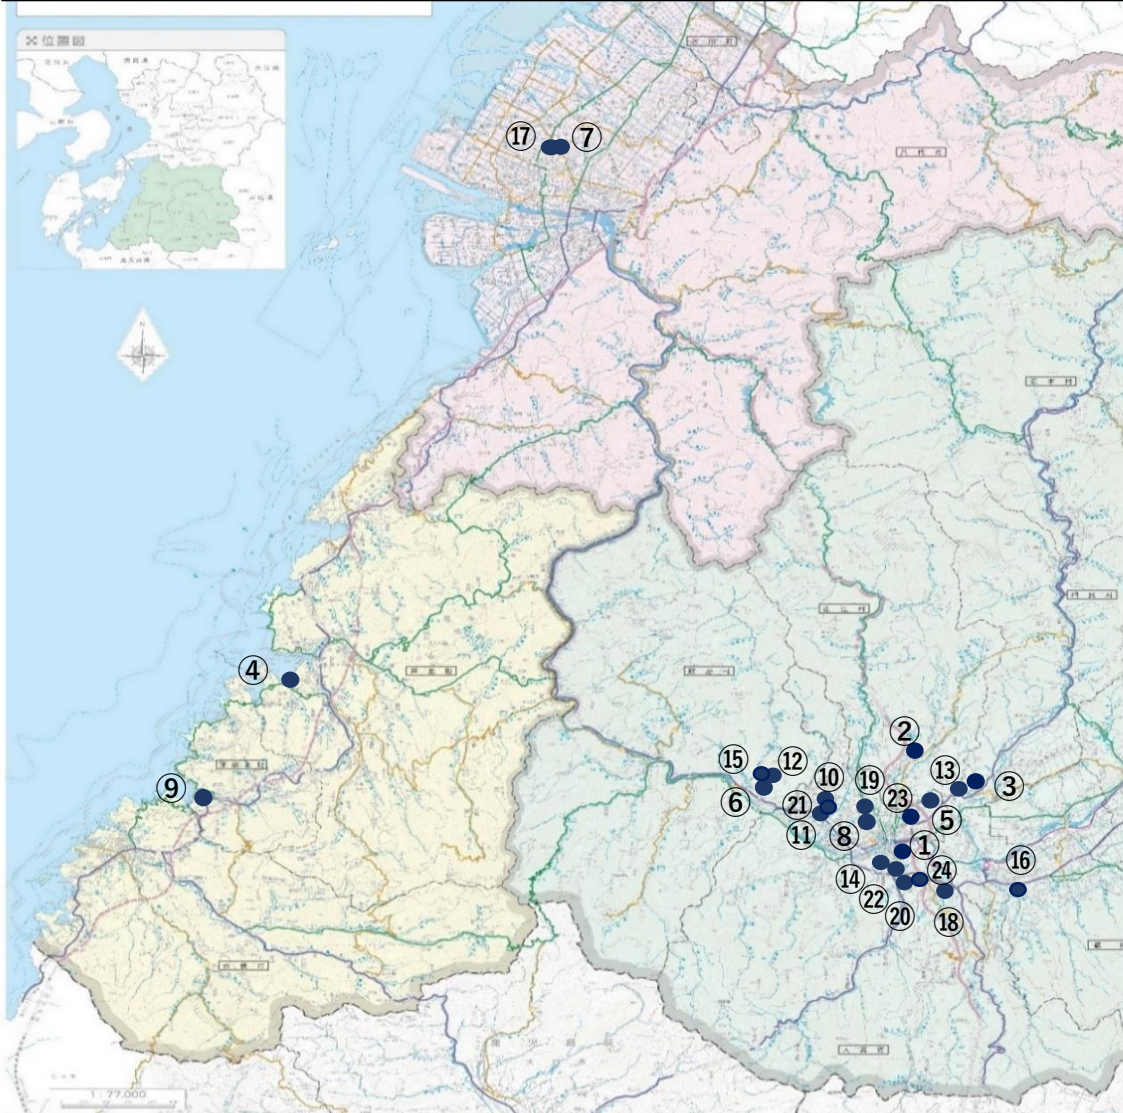

着手済み団地の状況（令和2年12月9日時点）

市町村	団地名	戸数	戸数	種別	集会施設	着手日	完成予定時期	施工状況等
八代市	⑦八代市民球場仮設団地	26戸	40戸	木造住宅	1棟	7月19日	9月9日完成	9月11日入居開始
	⑩八代市古閑中町仮設団地	14戸		木造住宅	1棟	8月9日	10月14日完成	10月16日入居開始
人吉市	①人吉市人吉城跡仮設団地	15戸	380戸	木造住宅	—	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始
	⑤人吉市梢山グラウンド仮設団地	33戸		木造住宅	1棟	7月15日	9月7日完成	9月10日入居開始
	⑧人吉市村山あやめ広場仮設団地	16戸		木造住宅	1棟	7月19日	9月16日完成	9月19日入居開始
	⑩人吉市下原田第一仮設団地	(第一期) 18戸		木造住宅	1棟	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
		(第二期) 16戸		木造住宅	—	9月7日	11月4日完成	11月6日入居開始
	⑪人吉市下原田第二仮設団地	11戸		木造住宅	—	7月30日	9月16日完成	9月19日入居開始
	⑭人吉市西間上第一仮設団地	51戸		木造住宅	1棟	8月1日	10月7日完成	10月9日入居開始
	⑯人吉市石野公園仮設団地	37戸		木造住宅	1棟	8月13日	10月28日完成	11月2日入居開始
	⑰人吉市村山公園仮設団地	84戸		木造住宅	2棟	8月13日	10月28日完成	11月2日入居開始
	⑳人吉市西間上第二仮設団地	28戸		木造住宅	1棟	8月28日	11月4日完成	11月6日入居開始
	㉑人吉市下原田第三仮設団地	24戸		木造住宅	1棟	9月17日	11月25日完成	11月27日入居開始
	㉒人吉市西間上第三仮設団地	14戸		木造住宅	—	9月28日	11月25日完成	11月27日入居開始
	㉓人吉市鬼木仮設団地	16戸		木造住宅	1棟	10月8日	12月9日完成	12月13日入居開始予定
	㉔人吉市川上記念球場仮設団地	17戸		木造住宅	1棟	10月16日	12月2日完成	12月7日入居開始予定
芦北町	④芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地	(第一期) 50戸	60戸	木造住宅	1棟	7月15日	9月14日完成	9月16日入居開始
		(第二期) 10戸		木造住宅	—	8月28日	10月21日完成	10月23日入居開始
津奈木町	⑨津奈木町男島仮設団地	10戸	10戸	木造住宅	1棟	7月28日	9月24日完成	9月26日入居開始
相良村	③相良村松葉仮設団地	16戸	24戸	木造住宅	—	7月13日	8月20日完成	8月22日入居開始
	⑬相良村総合運動公園仮設団地	8戸		木造住宅	—	8月1日	9月9日完成	9月12日入居開始
山江村	②山江村中央グラウンド仮設団地	25戸	25戸	木造住宅	1棟	7月11日	8月20日完成	8月22日入居開始
球磨村	⑥球磨村多目的広場仮設団地	33戸	269戸	ムービングハウス	1棟	7月16日	7月31日完成	8月2日入居開始
	⑫球磨村グラウンド仮設団地	113戸		木造住宅	2棟	8月1日	10月7日完成	10月10日入居開始
	⑮球磨村さくらドーム仮設団地	35戸		ムービングハウス	1棟	8月7日	9月19日完成	9月20日入居開始
	⑯球磨村大王原公園仮設団地(錦町)	88戸		木造住宅	2棟	8月7日	10月21日完成	10月24日入居開始
計	24団地 木造住宅 22団地 ムービングハウス 2団地		808戸 木造住宅 740戸 ムービングハウス 68戸		22棟			※みんなの家：20棟
