

相良村

球磨地域振興局 復興への取組み

令和3年（2021年）9月30日

熊本県県南広域本部球磨地域振興局

※スケジュールは、現時点の予定であり、変更になる場合があります。

1 堆積土砂の撤去

○相良村内の県管理河川に堆積した土砂のうち、特に緊急に撤去が必要な約18.3万m³（川辺川）を5月末までに撤去し、今後も堆積状況を踏まえ、維持掘削を実施。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
堆積土砂撤去	撤去完了		維持管理上、必要な土砂撤去の継続的な実施		

2 道路・河川等の災害復旧

○相良村内の県が管理する道路や河川等のうち、被災した32箇所（約22億円）について、復旧工事を行うもの。
 ○8月末時点で9箇所（約4億円）の工事に着手。
 ○なお、本格的な工事着手までに時間を要する箇所のうち、出水により家屋等への影響が懸念される箇所等については、応急対策を実施。



事業名等	スケジュール			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
災害復旧事業	応急工事		復旧工事	

3 治山による山の再生・強化

○被災した治山施設の復旧や林地の復旧（県施行）
 ・治山施設については8月までに1箇所に着手。なお、本年度末までに更に2箇所着手予定。全ての箇所の完成はR6年度中を予定。
 ・林地等については8月までに3カ所に着手。なお、本年度末までに更に8箇所を着手予定。R4年度以降は、計画的に復旧対策に着手し、全ての箇所の完成はR8年度中を予定。

区分	箇所数	スケジュール						
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
被災した治山施設の復旧	6	[1カ所着手]						
被災した林地等の復旧	17	[3カ所着手]						

くぎわら
 【四浦字久木原地区の林地崩壊】 地図番号:5、6



4 生産基盤の復旧状況

○営農用機械・施設、林道・林産施設、農地・農業用施設（村施行）
 被災した農業用機械、林道・林産施設や農地・農業用施設の復旧に向けては、相良村において国・県等関係機関と連携し計画的に実施中。
 ○県は、計画変更や設計協議等の技術的支援を引続き実施。

区分	経営体・箇所数	スケジュール				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
営農用機械・施設	65	[42経営体完了]				
林道施設	22					
特用林産施設	1					
農地・農業用施設	81	[1件完了、22件施工中]				


R3年8月末

5 スマート農業への取組み支援

柳瀬において「全自動田植機とドローン防除」の実演会を開催（6/17）。
 今秋には、全自動コンバインによる稲刈りの実演会を予定。



令和2年7月豪雨 球磨地域振興局管内
治山関係災害箇所位置図（相良村）

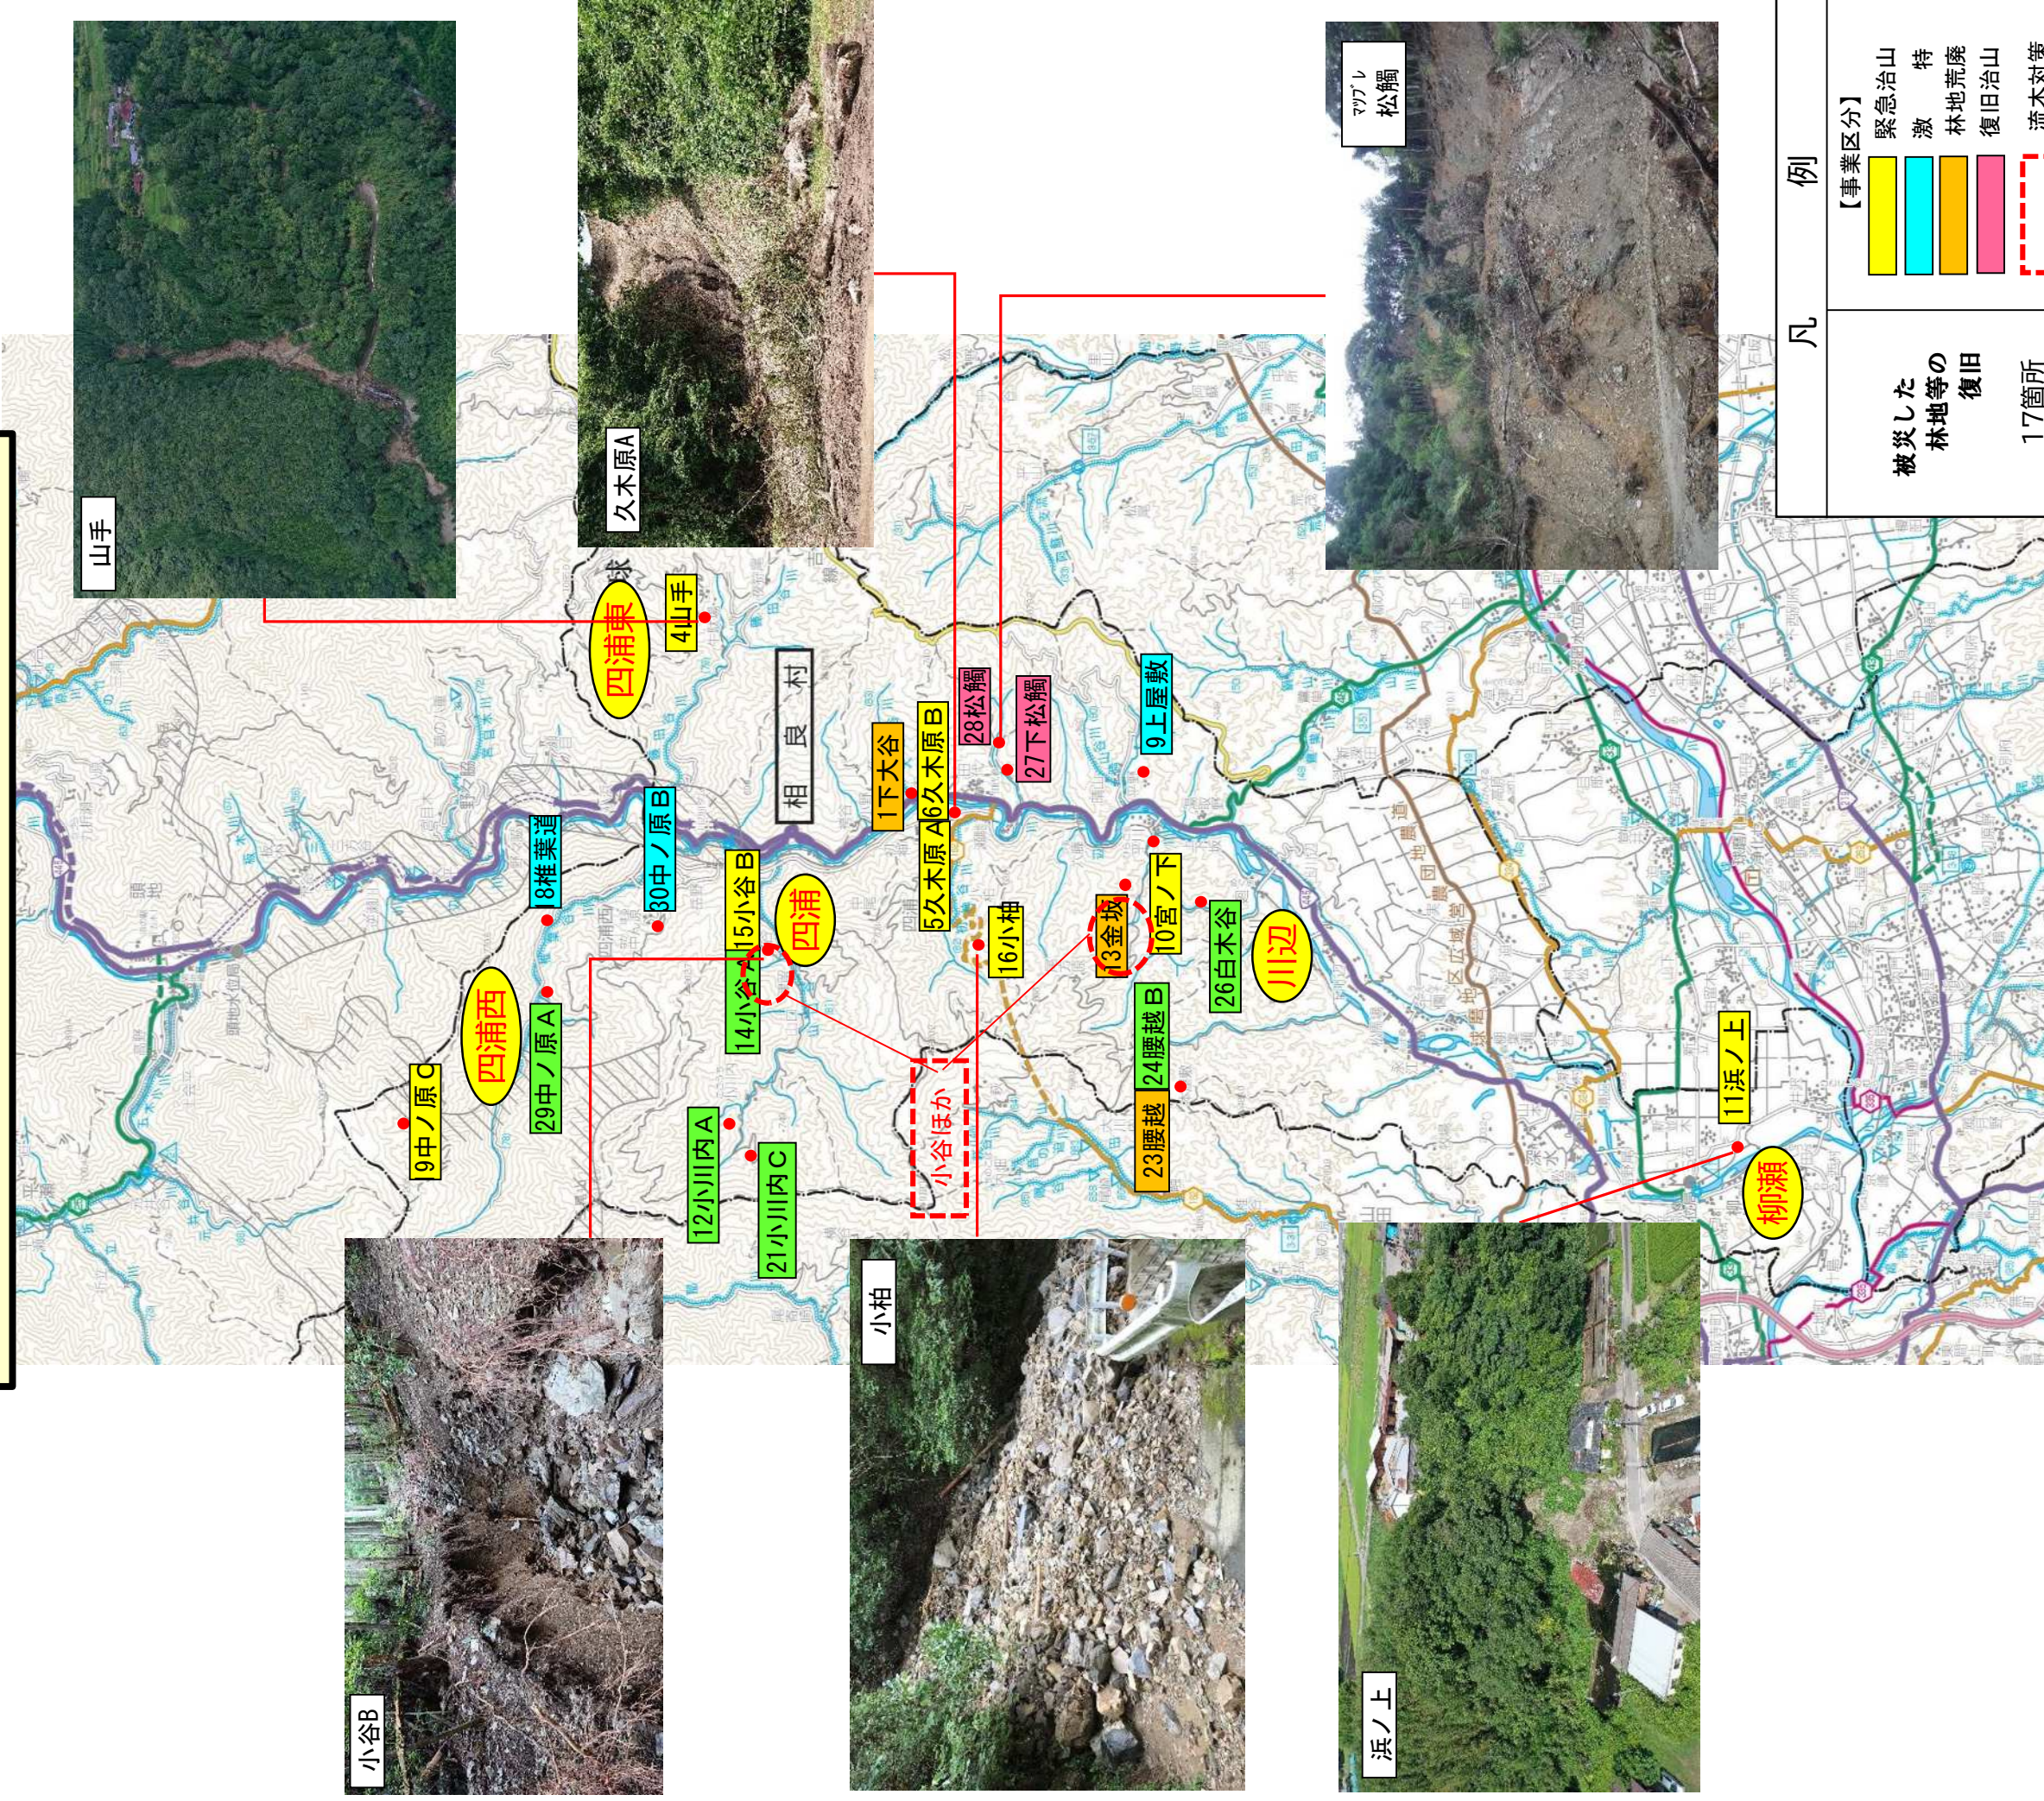

凡 例	
被災した 林地等の 復旧 17箇所	【事業区分】 緊急治山 激 林地荒廃 復旧治山 流木対策
被災した 治山施設の 復旧 6箇所	【事業区分】 施設 災
