

第2回
熊本県 中九州横断道路 事業調整会議

令和6年4月25日

国土交通省 九州地方整備局

熊本県

熊本市

①中九州横断道路(熊本県側)の進捗状況一覧

路線名	箇所名	延長	状況	事業中箇所の 令和6年度事業予定内容(熊本県側)
中九州横断道路	竹田阿蘇道路	22.5km	事業中	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進 ・用地買収推進 ・橋梁下部工工事推進
	滝室坂道路	6.3km	事業中	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進 ・改良工事、トンネル工事等推進
	大津道路	4.8km	事業中 (R6年度事業化)	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進
	大津熊本道路 (大津西～合志)	4.7km	事業中	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進
	大津熊本道路 (合志～熊本)	9.1km	事業中	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進 ・用地買収推進 ・橋梁下部工工事等推進
	熊本環状連絡道路	約 4km	調査中	R6.2.20 都市計画決定

※ 延長は熊本県外の延長を含む

②中九州横断道路(熊本県側)の進捗状況




▲着工式 (R5. 9. 24)

▲トンネル貫通式 (R5. 6. 18)



③中九州横断道路(熊本県側)周辺の開発状況

中九州横断道路

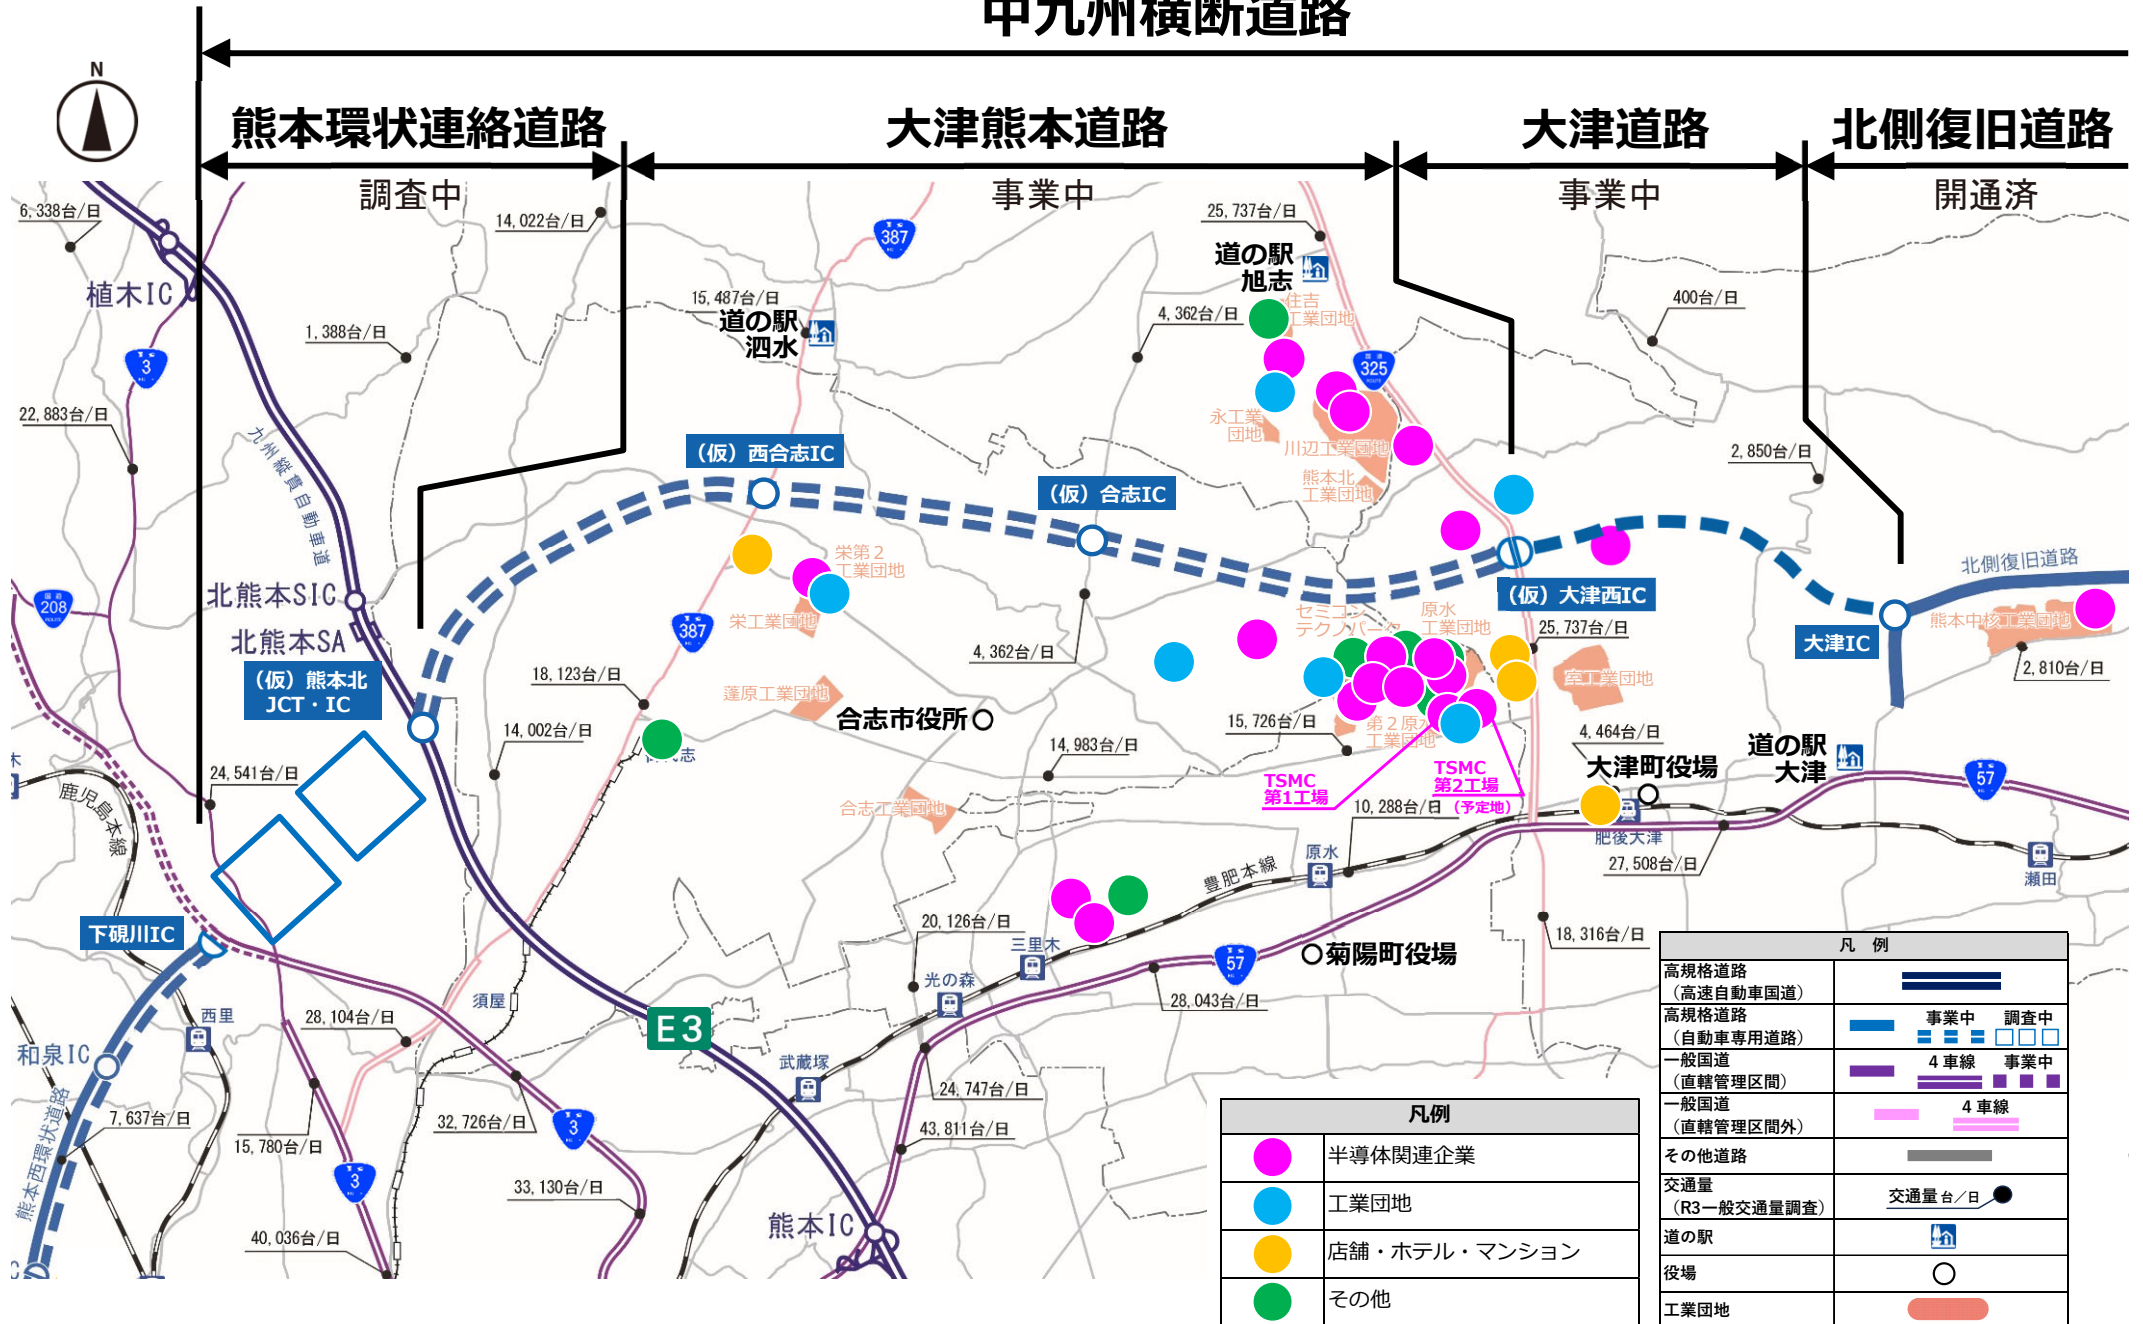

※R3年度以降に開発(予定含む)している箇所を図示


④中九州横断道路(熊本県側)周辺の交通状況等

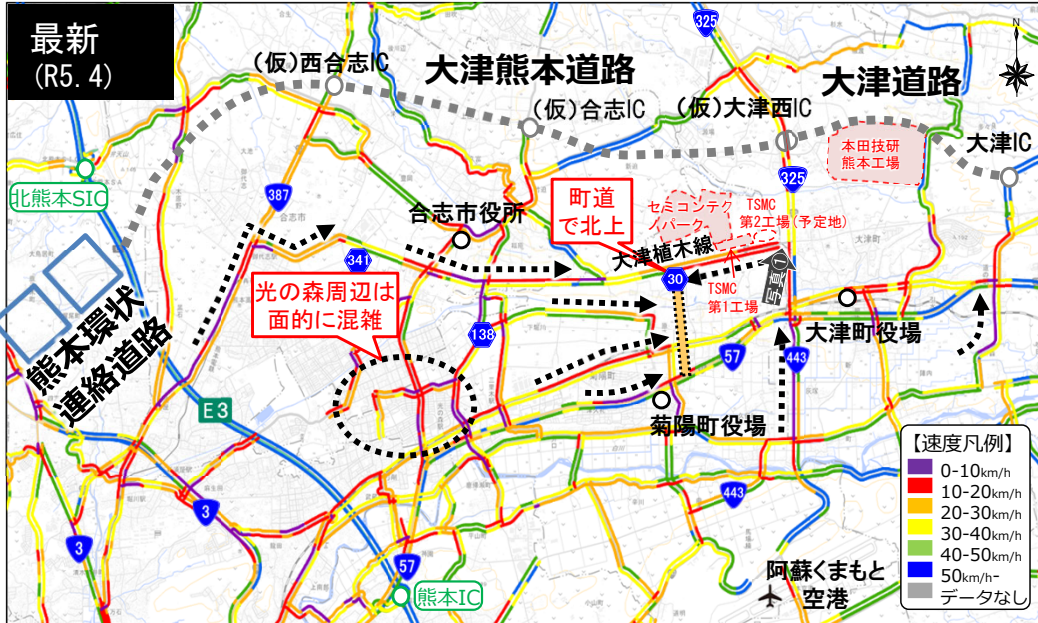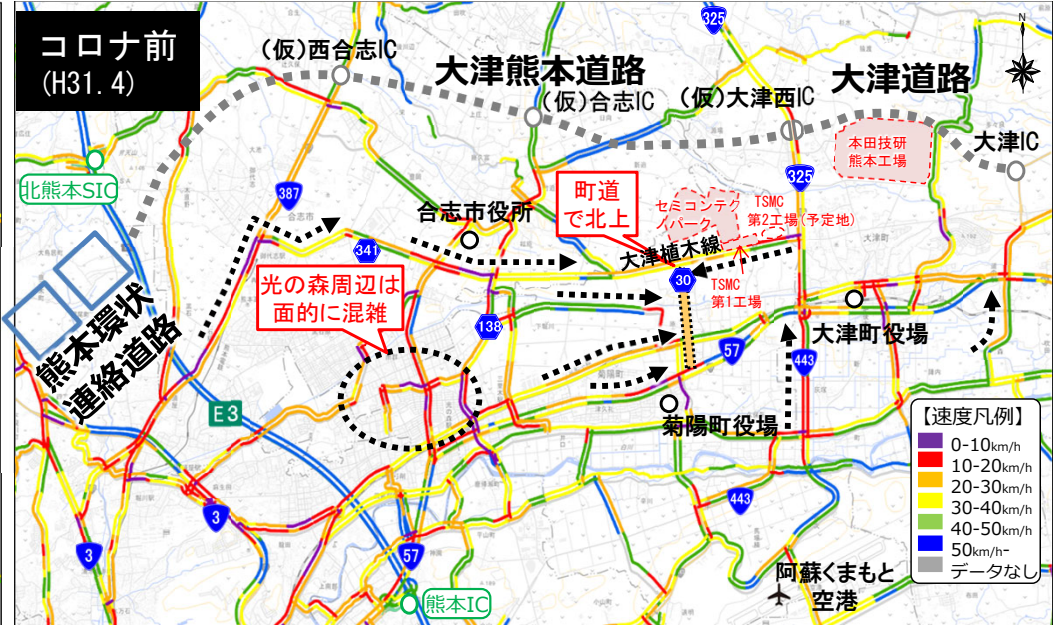

【下図】地理院地図(電子国土web) 【利用データ】ETC2.0プローブ情報 【分析期間】H28.4月・H31.4月・R5.4月 いずれも平日朝7時台

出典：令和5年度 第1回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工

⑤中九州横断道路(熊本県側)周辺の道路整備状況

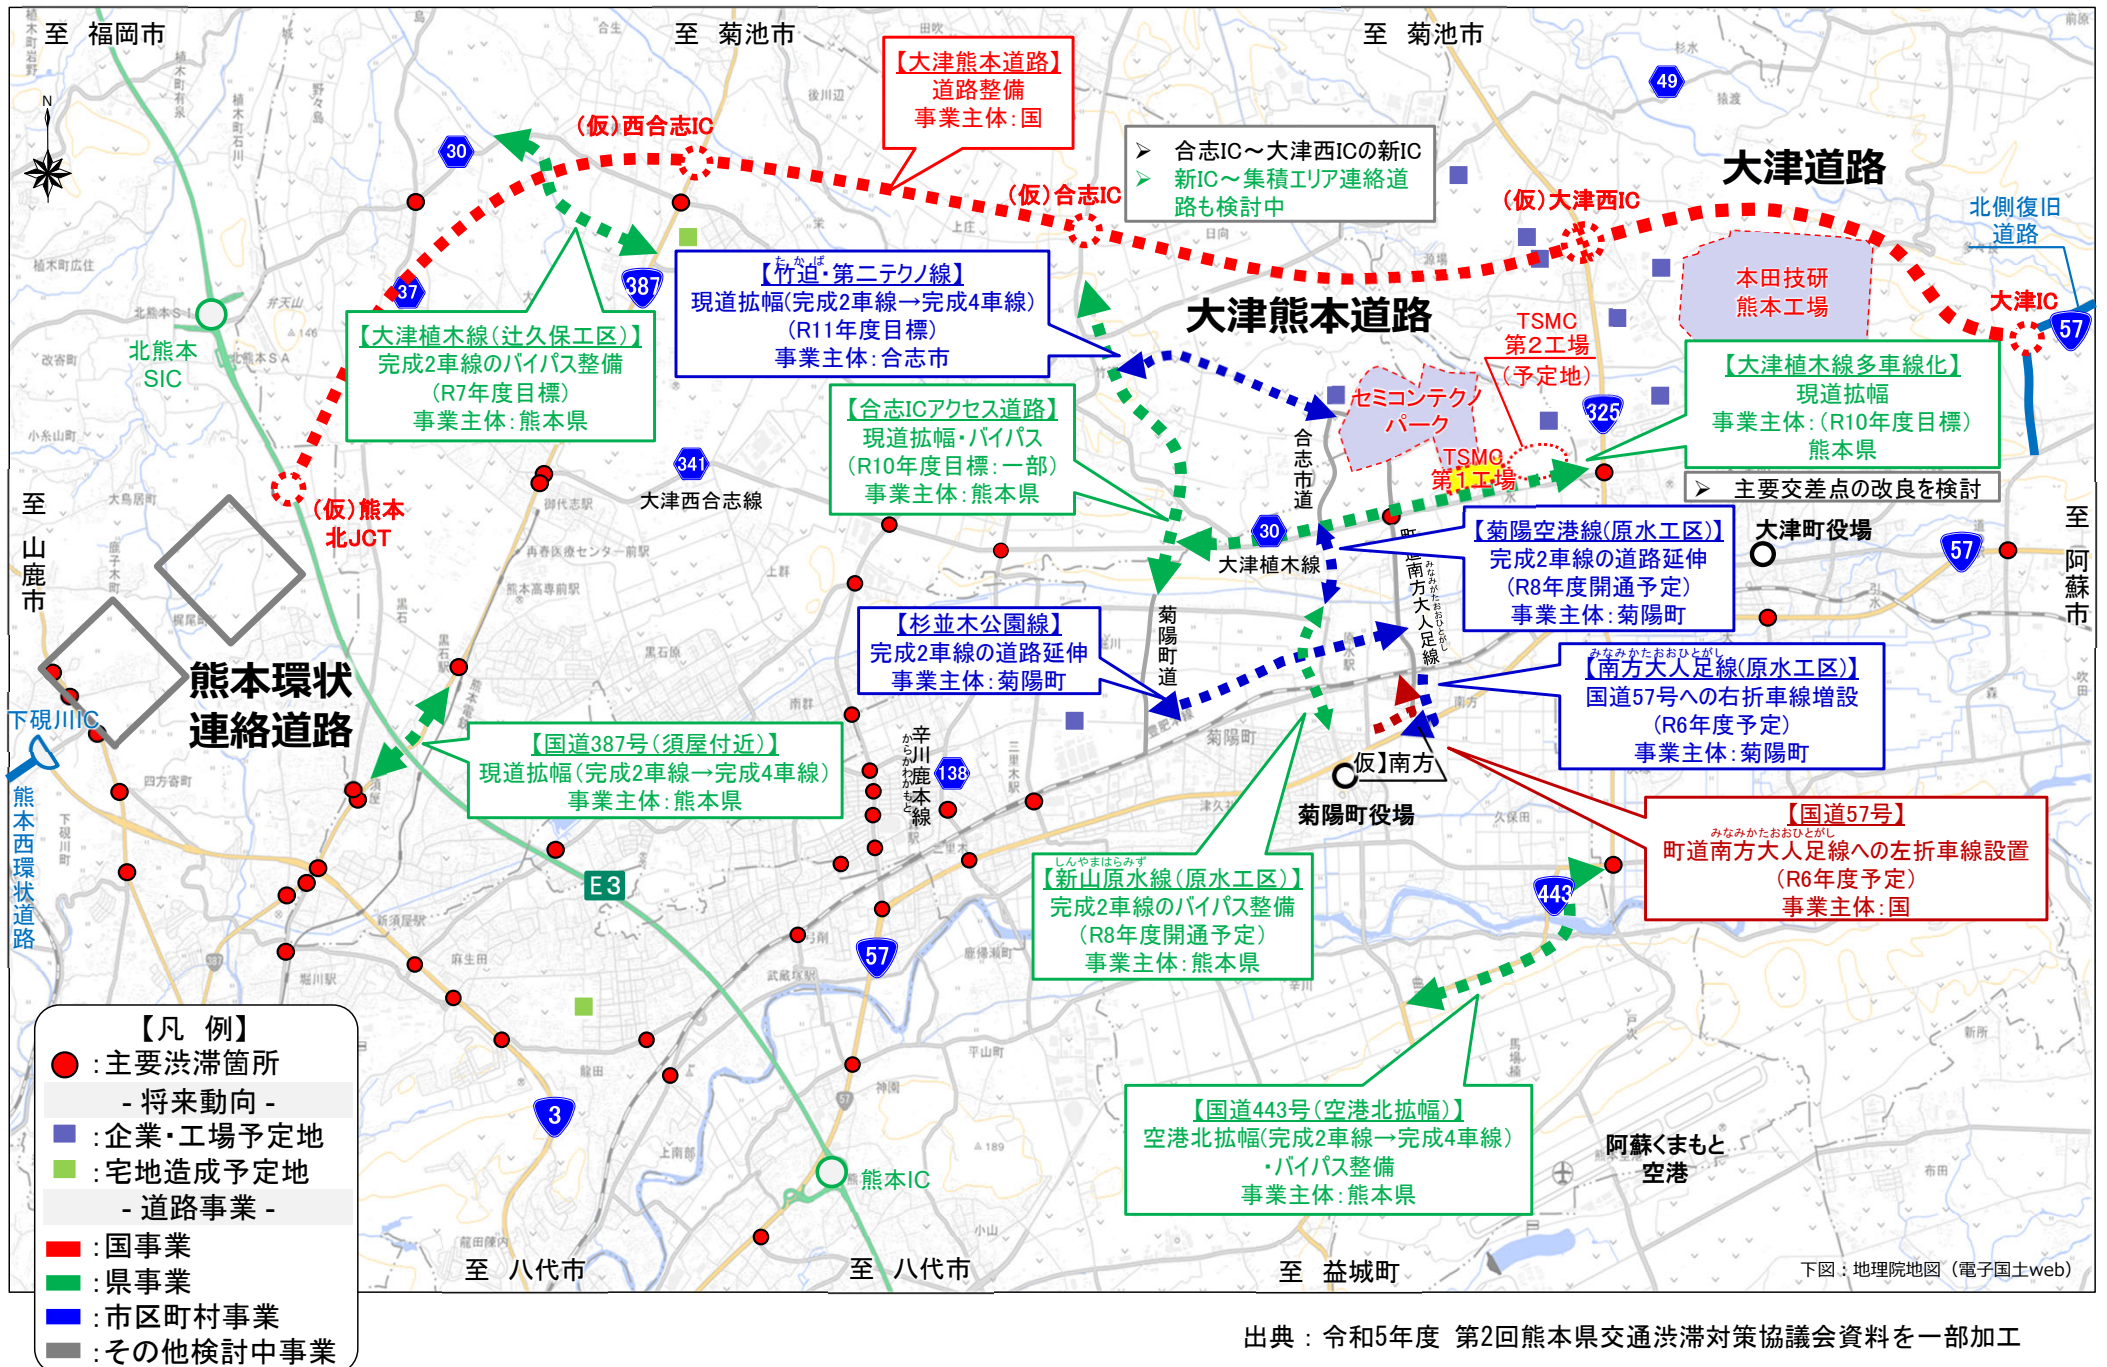

第2回 熊本県 中九州横断道路 事業調整会議

【熊本県・熊本市 要望・提案事項資料】

令和6年4月25日

熊本県

熊本市

中九州横断道路の早期整備実現に向けた要望・提案事項

【熊本県・熊本市からの要望・提案事項】

《要望》○熊本都市圏の円滑な人流・物流機能を確保する観点から、熊本環状連絡道路についても大津熊本道路の供用に遅れることがないよう早期事業化に特段の配慮をお願いする。

《提案》○大津西IC～下碓川IC間について、有料道路事業を導入し、確実な早期整備を実現していただくよう提案する。



※今後の交通状況、周辺状況等を踏まえ、変更の可能性はある。
